


1. 頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(二)(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(二)(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(苗栗營運所)
承攬廠商	俊城水電工程有限公司
計畫期程	130 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 100 工作天)
總經費(元)	總預算金額：23,828,700 元 契約金額：17,550,000 元
年度	112
工作項目	φ 100mm DIP-3, 346m、φ 200mm DIP-842m
開工日期	112 年 12 月 15 日
預計完工日期	113 年 10 月 25 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%(113 年 12)

施工範圍示意圖

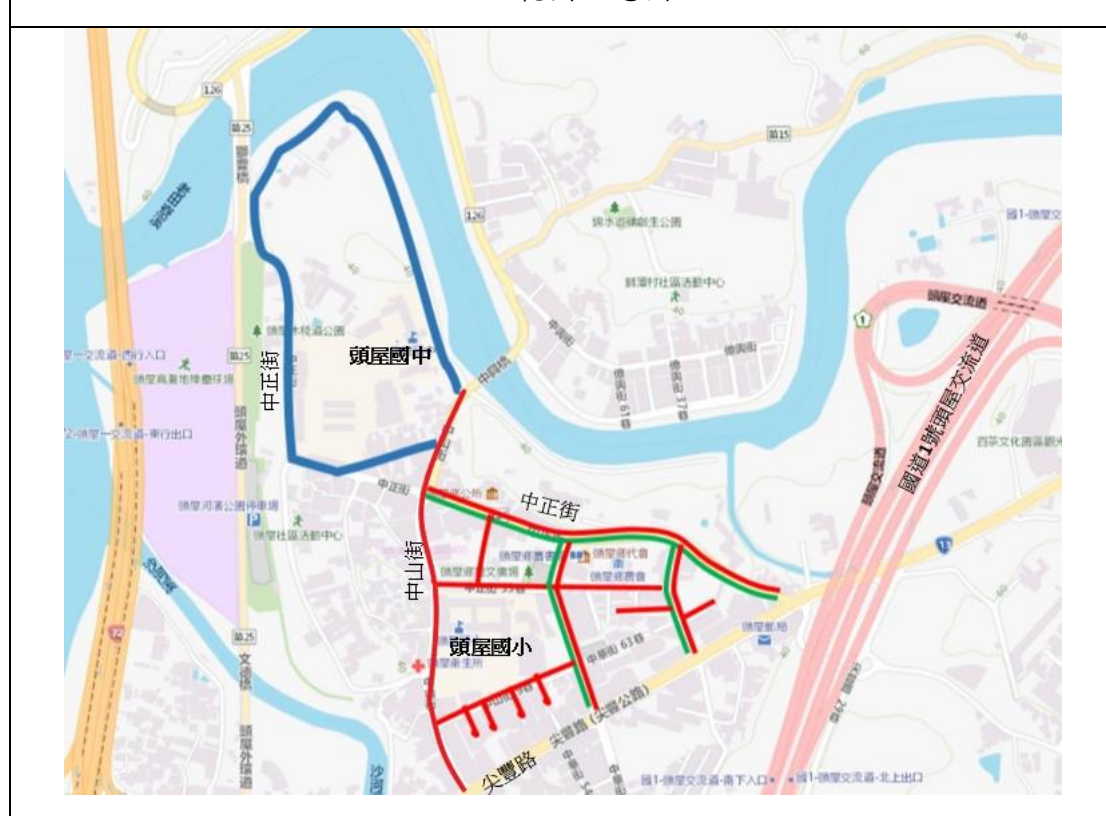


經濟部查核照片(113.3.25)



## 2. 頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(三)(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(三)(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處
承攬廠商	光陞工程有限公司
計畫期程	130 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 100 工作天)
總經費(元)	總預算金額：21,033,400 元 契約金額：15,155,000 元
年度	112
工作項目	φ 100mm DIP-1,862m、φ 200mm DIP-1,590m
開工日期	112 年 12 月 12 日
預計完工日期	113 年 10 月 25 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

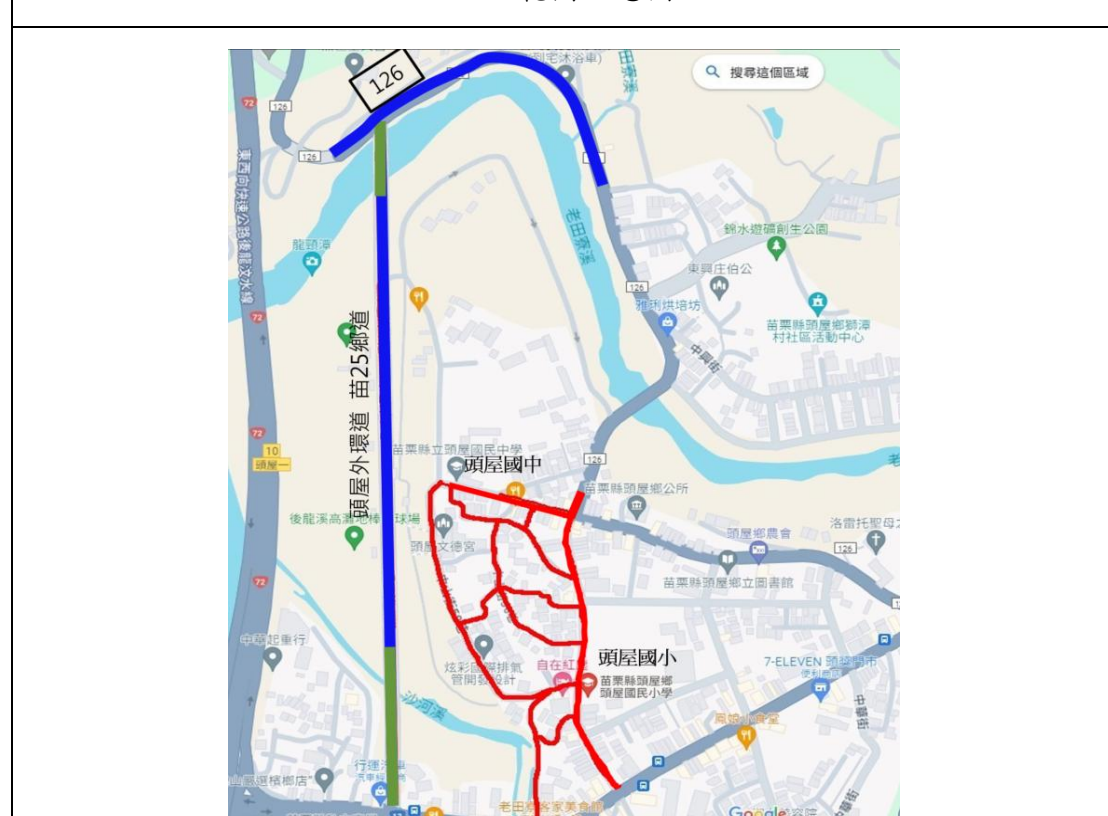

經濟部查核照片(113. 3. 25)



### 3. 新竹縣湖口鄉新湖路供水改善工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	新竹縣湖口鄉新湖路供水改善工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(湖口營運所)
承攬廠商	翊恩營造股份有限公司
計畫期程	70 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 40 工作天)
總經費(元)	總預算金額：18,713,150 元 契約金額：11,060,000 元
年度	113
工作項目	φ 100mm DIP-1,862m、φ 200mm DIP-1,590m
開工日期	113 年 3 月 28 日
預計完工日期	113 年 8 月 30 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖



經濟部查核照片(113.8.26)



4. 新竹縣新埔鎮南北平里供水延管工程(一)及分擔款部份用戶外線工程(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	新竹縣新埔鎮南北平里供水延管工程(一)及分擔款部份用戶外線工程(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	晁豐工程有限公司
計畫期程	130 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 100 工作天)
總經費(元)	總預算金額：32,697,300 元 契約金額：22,380,000 元
年度	113
工作項目	φ 100mm DIP-5, 086m、φ 200mm DIP-990m
開工日期	113 年 4 月 18 日
預計完工日期	113 年 11 月 15 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖



經濟部查核照片(113.8.26)



5. 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼工業區(含住宅區)汰換管線工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼工業區(含住宅區)汰換管線工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(通霄銅鑼營運所)
承攬廠商	伸榮工程有限公司
計畫期程	180 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 150 工作天)
總經費(元)	總預算金額：34,607,650 元 契約金額：23,070,000 元
年度	113
工作項目	φ 100mm DIP-2,300m、φ 200mm DIP-1,470m
開工日期	113 年 2 月 5 日
預計完工日期	114 年 1 月 15 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖



經濟部查核照片(113.9.27)



6. 苗栗縣公館鄉南河村 1-12 鄰、北河村 2-9 鄰供水延管及用戶外線工程(一)(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣公館鄉南河村 1-12 鄰、北河村 2-9 鄰供水延管及用戶外線工程(一)(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	銓苗水電工程行
計畫期程	120 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 90 工作天)
總經費(元)	總預算金額：24,865,000 元 契約金額：13,771,429 元
年度	113
工作項目	φ 100mm DIP-3,040m、φ 200mm DIP-1,909m
開工日期	113 年 4 月 26 日
預計完工日期	114 年 5 月 5 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖




經濟部查核照片(114.1.14)



7. 苗栗縣苑裡鎮上館里 3、4、9、10 鄰供水延管及用戶外線工程(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣苑裡鎮上館里 3、4、9、10 鄰供水延管及用戶外線工程(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	金毅工程有限公司
計畫期程	210 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 180 工作天)
總經費(元)	總預算金額：37,780,000 元 契約金額：19,361,904 元
年度	113
工作項目	φ 100mm DIP-3,040m、φ 200mm DIP-1,909m
開工日期	113 年 5 月 13 日
預計完工日期	114 年 6 月 23 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

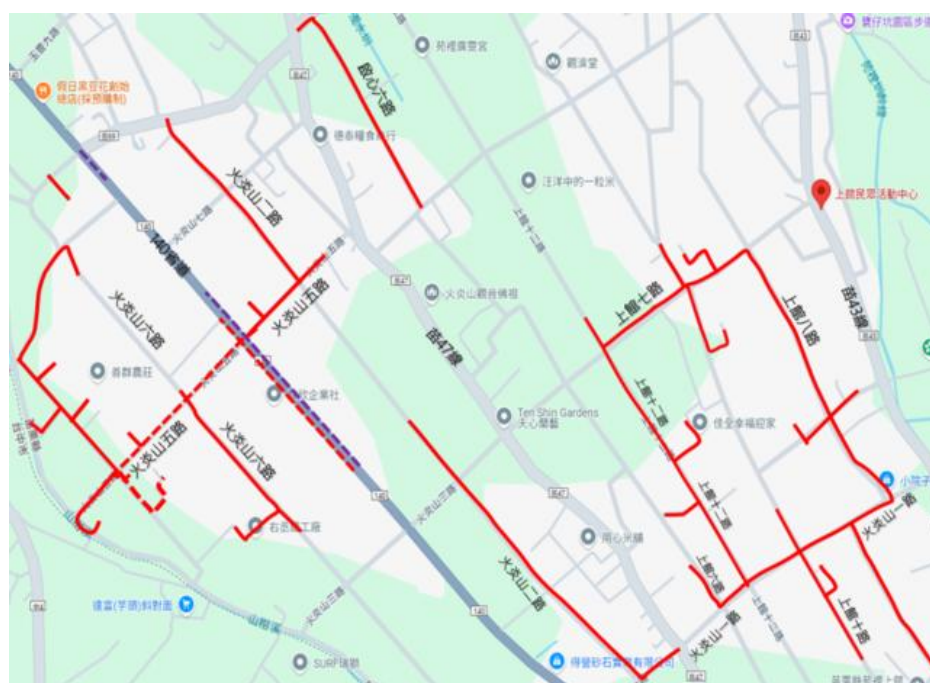


經濟部查核照片(114.2.20)



### 8. 北埔鄉南興街及光復街管線汰換工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	北埔鄉南興街及光復街管線汰換工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(竹東營運所)
承攬廠商	晁豐工程有限公司
計畫期程	65 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 50 工作天)
總經費(元)	總預算金額：12,078,000 元 契約金額：10,621,800 元
年度	114
工作項目	φ 100mm DIP-800m
開工日期	114 年 4 月 16 日
預計完工日期	114 年 7 月 25 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

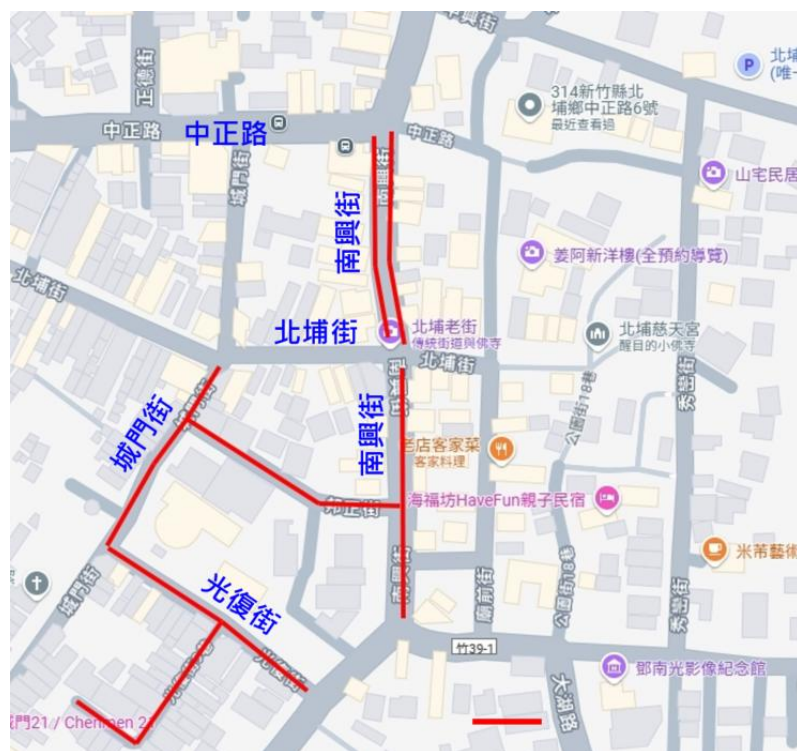

經濟部查核照片(114.7.8)



### 9. 新竹市新香街供水改善工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	新竹市新香街供水改善工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(新竹給水廠)
承攬廠商	嘉冠工程企業有限公司
計畫期程	55 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 40 工作天)
總經費(元)	總預算金額：5,977,050 元 契約金額：4,232,000 元
年度	114
工作項目	φ 100mm DIP-450m
開工日期	114 年 4 月 11 日
預計完工日期	114 年 7 月 28 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖



10. 苗栗縣苑裡鎮新復里 1、4、7 鄰供水延管工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣苑裡鎮新復里 1、4、7 鄰供水延管工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(通霄銅鑼營運所)
承攬廠商	俊城水電工程有限公司
計畫期程	55 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 40 工作天)
總經費(元)	總預算金額：7,420,000 元 契約金額：5,508,8000 元
年度	114
工作項目	φ 100mm DIP-1, 410m
開工日期	114 年 9 月 17 日
預計完工日期	115 年 1 月 27 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖




經濟部查核照片(115.1.14)



11. 苗栗縣公館鄉玉谷村 9 鄰、鶴岡村 10 鄰供水延管工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣公館鄉玉谷村 9 鄰、鶴岡村 10 鄰供水延管工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	伸榮工程有限公司
計畫期程	40 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 25 工作天)
總經費(元)	總預算金額：6,804,000 元 契約金額：5,131,350 元
年度	114
工作項目	φ 100mm DIP- 1, 167m
開工日期	114 年 9 月 30 日
預計完工日期	115 年 1 月 28 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

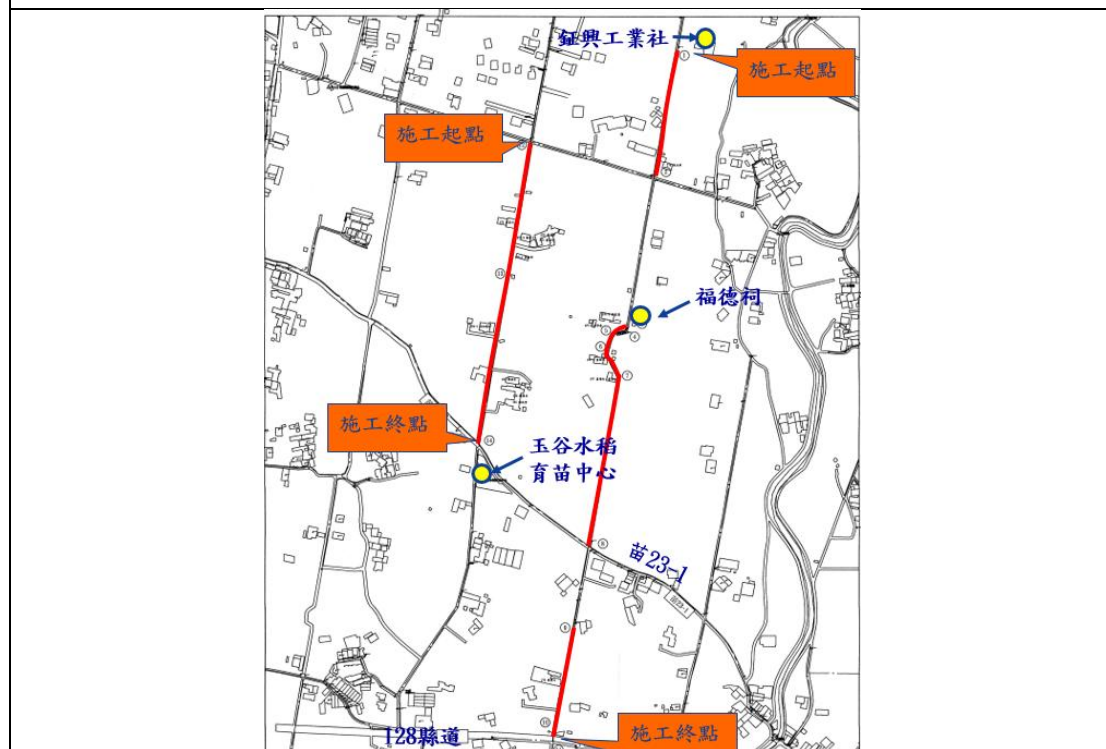

12. 苗栗縣通霄鎮南和里5鄰供水延管工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣通霄鎮南和里5鄰供水延管工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	日亨營造有限公司
計畫期程	25 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 10 工作天)
總經費(元)	總預算金額：1,390,935 元 契約金額：2,139,135 元
年度	114
工作項目	∅ 100mm DIP- 420m
開工日期	114 年 6 月 30 日
預計完工日期	115 年 1 月 16 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

